

Ziņojums par Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) ERAF projekta  
“Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta”  
(Vienošanās Nr.2.2.1.1/19/I/005)  
īstenošanas statusu

**Projekta nosaukums:** Būvniecības procesu un IS attīstība 2.kārta

**Projekta ieviešanas periods:** 26.11.2019. – 25.11.2022.

**Saņēmējs:** Būvniecības valsts kontroles birojs

**Projekta partneri:** EM, VZD, TA, PMLP, ZMNĪ, LNA, LVGMC, VRAA

**Ziņojums par periodu:** 01.01.2021. – 31.03.2021.

### 1. Projekta mērķi

Projekta vispārējais mērķis	Nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu pakalpojumu izveidi un sniegšanu, lai samazinātu administratīvo slogu, uzlabotu pakalpojumu pieejamību, veicinātu valsts pārvaldes efektivitāti un caurskatāmību.
Projekta mērķis	<p>1.Būvniecības nozares produktivitātes un būvniecības procesa efektivitātes kāpināšana, paaugstinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu būves dzīves cikla pārvaldībā.</p> <p>2.Administratīvā sloga samazināšana privātpersonām un juridiskām personām.</p> <p>3.Pakalpojumu pieejamības uzlabošana un publisko datu atkalizmantošanas pieaugums.</p> <p>Projekta mērķis ir BIS pilnveidošana, ieskaitot procesu optimizācijas un automatizācijas turpināšanu (pēc 1.kārtā veiktajiem procesu pilnveides darbiem) (ieceres iesniegšanas, saskaņošanas, būvniecības procesa kontroles, nodošanas un ekspluatācijas stadijām sistēmā), administratīvā sloga ietekmes mazināšana, automatizēta analītisku lēmumu pieņemšanas rīka (aģenta) izveide, un sistēmas uzlabošana, lai tā būtu vienota platforma jebkuras būves dzīvescikla pārvaldībai no ieceres līdz ekspluatācijas beigām, kā arī pamats Būves informācijas modelēšanas (turpmāk – BIM) procesu ieviešanai Latvijā un nodrošinātu nepieciešamo platformu no valsts informācijas sistēmas puses. BIM iespēju īstenošana BIS ietvaros ir projekta pamatievīze un katras problēmjas risinājums ir daļa, kas veicina un īsteno BIM kopējo procesu – tas ir, katrs risinājums veido kopīgu centralizētu platformu BIM procesa ieviešanai.</p>



## 2. Projekta ieviešanas gaita

Projekta aktiv. Nr.	Projekta aktivitātes nosaukums	Plānotais rezultāts	Sasniegtais rezultāts	Pārskata periodā veiktās aktivitātes
1.	Projekta vadība un īstenošana	Īstenots projekts		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Projekta ietvaros kopā notikušas 5 (no tām pārskata periodā 1) Būvniecības informācijas sistēmas Konsultatīvās padomes sēdes.</li> <li>- Projekta ietvaros kopā notikušas 3 (no tām pārskata periodā 0) Projekta valdes sēdes.</li> <li>- Projekta ietvaros kopā notikušas 60 (no tām pārskata periodā 12) Projekta vadības darba grupas sēdes.</li> <li>- Projekta ietvaros kopā notikušas 60 (no tām pārskata periodā 12) projekta komandas sēdes.</li> <li>- Projekta ietvaros kopā notikušas 59 (no tām pārskata periodā 33) projekta darba grupas.</li> <li>- Projekta ietvaros kopā sagatavoti 4 (no tiem pārskata periodā 1) Maksājumu pieprasījumi.</li> </ul>
2.	Konsultācijas pakalpojumu sniegšana			
2.1.	Projekta pamatojošās dokumentācijas izstrāde, saskaņošana un pārvaldība	Sagatavota projekta pamatojošā dokumentācija	Sagatavota projekta pamatojošā dokumentācija	2018.gada 26.aprīlī tika noslēgta vienošanās ar SIA "AA Projekts" par Konsultāciju pakalpojumu sniegšanu ERAF projekta "Būvniecības procesu un



	elektroniskā kopdarbības vidē			informācijas sistēmas attīstība 2.kārta" plānoto darbību īstenošanai. Darbība ir uzsākta pirms projekta īstenošanas un sagatavoti dokumenti uz projekta iesnieguma sagatavošanas brīdi. Izstrādāts Detalizētais projekta apraksts. Izstrādāts Izmaksu un ieguvumu analīzes dokuments. <b>Dokumenti izstrādāti.</b> <b>Aktivitāte ieviesta.</b>
2.2.	Informācijas sistēmas izstrādes iepirkuma Tehniskās specifikācijas izstrāde	Izstrādāta tehniskā specifikācija	Izstrādāta tehniskā specifikācija	Tehniskā specifikācija izstrādāta. Iepirkums noorganizēts, sniegts atbalsts iepirkuma norises laikā un BIS funkcionalitātes pilnveides darbus veiks SIA Tieto Latvia. <b>Aktivitāte ieviesta.</b>
2.3.	Projekta ieviešanas dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un kvalitātes kontrole	Nodrošināta kvalitātes kontrole un dokumentācijas izstrādes pakalpojums		
2.3.1.	Būvniecības procesu pilnveides tehnisko specifikāciju izstrāde un biznesa procesu un biznesa prasību specifikāciju izstrāde	Izstrādātas 8 gb. Tehniskās specifikācijas	4 gb.	Līdz šim izstrādātas: 1) 1.laidiena tehniskā specifikācija "Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide" (1 gb.) 2) 2.laidiena tehniskā specifikācija "Būvniecības process – 1.daļa" (1.gb.) 3) 3.laidienam tehniskā specifikācija "Ekspluatācija – 1.daļa". Pārskata periodā:



				4) 4.laidienam tehniskā specifikācija “Būvniecība – 2.daļa”. 5) Uzākta tehniskās specifikācijas izstrādes 5.laidienam “Ekspluatācija – 2.daļa”.
2.3.2.	Informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole	Veikta informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontrole (36 mēneši)	13 ziņojumi	Līdz šim projekta ietvaros organizētas 60 sanāksmes informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas kontroles nodrošināšanai, no tām pārskata periodā 12 sanāksmes. Sagatavoti 13 ziņojumi par kvalitātes kontroles nodrošināšanu, no tiem 2 ziņojumi pārskata periodā.
3.	Informācijas sistēmas pilnveide			
3.1.	Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas pilnveide	Pilnveidots Būvniecības ieceru un būvprojektu izskatīšanas un saskaņošanas process (1 gab.). Izstrādāti/pilnveidoti e-pakalpojumi (4 gab.): •Būvniecības ieceres un būvprojekta saskaņojuma saņemšana •Trešo personu saskaņojuma saņemšana •Piekluve būvniecības lietai	Daļēji pilnveidots process. Izstrādāts e-pakalpojums Piekluve būvniecības lietai.	2019.gada 6.decembrī noslēgts iepirkuma līgums ar SIA Tieto Latvia par BIS funkcionalitātes pilnveides un uzturēšanas darbiem. 2.laidiena ietvaros nodrošināta pieprasījuma iesniegšana piekluvei pie būvniecības lietas, pieprasījumu un pieejamo būvniecības lietu pārvaldīšana BISP autorizēta lietotāja darba vietā. Pilnveidots detalizētā projekta rasējuma saskaņošanas process. Automatizēts tehnisko noteikumu pieprasīšanas process – izmantojot ATIS datus sistēma informē lietotāju par tehnisko noteikumu nepieciešamību.



				Izstrādāta un saskaņota BIS 2.kārtas 4.laidiena “Būvniecība – 2.daļa” tehniskā specifikācija. Funkcionalitātes izstrādes uzsākšana notiks ar š.g. aprīli.
3.2.	Būvniecības procesa uzraudzības pilnveide	Pilnveidots Būvniecības uzraudzības process (1 gab.). Pilnveidots epakalpojums: 1) Sūdzību iesniegšana (1 gab.) Atvērto datu kopas: 1) Ar būvniecību saistīto valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites informācija (sniegto pakalpojumu skaits) (1 gab.). 2) Būvniecības informācijas sistēmā veikto saskaņojumu uzskaites informācija (1 gab.).	Daļēji pilnveidots Būvniecības uzraudzības process (1 gab.). attiecībā uz iespēju realizēt būvniecības procesu pa kārtām.	Veiktas funkcionalitātes pilnveides un pieejama produkcijā ERAF 2.kārtas 2 laidiena “Būvniecības process – 1.daļa” pilnveidojumi ar 2021.gada janvāri. Nodrošināta iespēja realizēt ieceri pa būvniecības kārtām. Izveidota iespēja Būvinspektoram veidot pārbaužu grafikus. Pilnveidota darba uzdevumu funkcionalitāte, kā arī papildināta būvdarbu žurnāla funkcionalitāte
3.3.	Būvju ekspluatācijas uzraudzības pilnveide	Pilnveidots Būvju ekspluatācijas uzraudzības process (1 gab.). un izstrādāts epakalpojums - Būves ekspluatācijas lieta (1 gab.).		Saskaņota 3.laidiena “Ekspluatācija – 1.daļa” tehniskās specifikācija. Turpinās darbs pie biznesa prasību definēšanas un funkcionalitātes pilnveides.  Laidiena ietvaros plānoti 4 sprinti, sīkāka informācija: <a href="https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita">https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita</a> .
3.4.	Būvkomersantu datu pārvaldības procesa pilnveide	Pilnveidots Būvkomersantu datu pārvaldības process (1 gab.). pilnveidots epakalpojums – Dati no būvkomersantu reģistra (1 gab.). Atvērto datu kopa – Būvkomersantu raksturojošā	Plānots precizēt aktivitātes saturu, izklāujot atvērto datu kopu no papildināta klasifikatora.	Saskaņota 4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” tehniskās specifikācija. Darbs pie biznesa prasību definēšanas un funkcionalitātes pilnveides tiks uzsākts aprīlī.



		informācija (no papildinātā klasifikatora) (1 gab.).		Laidiena ietvaros plānoti 6 sprinti, sīkāka informācija: <a href="https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita">https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita</a> .
3.5.	Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide	Pilnveidots Būvspeciālistu datu pārvaldības process (1 gab.). Atvērto datu kopas - sertificēto būvspeciālistu raksturojošie dati (1 gab.).	Pilnveidots Būvspeciālistu datu pārvaldības process (1 gab.). Atvērto datu kopas - sertificēto būvspeciālistu raksturojošie dati (1 gab.).	Izstrādāta, saskaņota un ieviesta produkcijā BIS 2.kārtas 1.laidiena "Būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide" funkcionalitāte. <b><i>Funkcionalitāte produkcijā, aktivitāte ieviesta.</i></b>
3.6.	Ēku energoefektivitātes pārvaldības pilnveide	Pilnveidots Ēku energoefektivitātes pārvaldības process (1 gab.). Atvērto datu kopas (2 gab.): - energosertifikācijas neatkarīgo ekspertu dati; - ekspluatācijā nodoto ēku energoefektivitātes rādītāju dati.	Plānots grozīt aktivitātes saturu.	
3.7.	Apziņošanas un informēšanas procesa pilnveide	Pilnveidots Apziņošanas un informēšanas process (1 gab.). Pilnveidots e-pakalpojums: Atgādinājumu saņemšana (1 gab.).	Daļēji realizēts process attiecībā uz 1. un 2. laidiena procesu pilnveidojumiem.	1. un 2 laidienu ietvaros ir izveidoti vairāki paziņojumi/brīdinājumi pilnveidoto procesu atbalstam, t.sk. paziņojumi par piekļuvi attiecīgai lietai un par izmaiņām detalizētā projekta rasējuma lapu skaņošanas procesā. Veikta BIS mājas lapas esošās informācijas pieejamības izvērtēšana saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā". Pati mājas lapa nodalīta no BIS iekšējā portāla.



3.8.	Būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites procesa izveide	Izstrādāts būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaites process		<p>Saskaņota 4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” tehniskās specifikācija. Darbs pie biznesa prasību definēšanas un funkcionalitātes pilnveides tiks uzsākts aprīlī.</p> <p>Laidiena ietvaros plānoti 6 sprinti, sīkāka informācija: <a href="https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita">https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita</a>.</p>
3.9.	Administratoru un BIS lietotāju apmācības, t.sk. atbalsta materiālu izstrāde.	Apmācīti 700 BIS administratori un lietotāji par jaunizveidoto funkcionalitāti. Izstrādāti 8 pilnveidotajiem/izveidotajiem būvniecības procesiem apmācību, atbalsta un lietotāju materiāli, t. sk. interaktīvi materiāli un rokasgrāmatas.	1300	<p>Kopumā ERAF projektā par jaunizstrādāto funkcionalitāti organizēti 34 tiešsaistes apmācību pasākumi, apmācot 1300 lietotājus. (Pārskata periodā par 2.laidiena “Būvniecības process – 1.daļa” funkcionalitāti organizēts 21 pasākums un apmācīti 936 lietotāji).</p> <p>Pilnveidoti 1. un 2.laidiena izstrādātās funkcionalitātes atbalsta un lietotāju materiāli.</p>
4.	IS ieviešanas kvalitātes kontrole (audits)	4 Audita ziņojumi	1	<p>Veikts EIS iepirkums par IS auditu. 2020.gada 4.novembrī noslēgts līgums ar SIA “AA Projekts” par audita veikšanu. Veikts drošības audits visiem BIS moduļiem un saskarnēm pēc 2.laidiena ieviešanas produkcijā. Sagatavots audita ziņojums, ziņojumā minētās rekomendācijas vai nu ir ieviestas vai ar tām ir papildināts risku pārvaldības plāns.</p>



5.	Publicitāte	Preses relīzes	10	<p>Izgatavots informatīvs plakāts par projektu. Izvietots BVKB Kancelejā, K.Valdemāra ielā 157, Rīga, klientiem un iedzīvotājiem labi pieejamā un pārredzamā vietā.</p> <p>Izveidota sadaļa informācijas publicēšanai par ERAF 2.kārtas projekta ieviešanas gaitu BIS portālā: <a href="https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta">https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta</a></p> <p>Pārskata perioda publikācijas: 1. Publikācija: Notiks vebināri BIS lietotājiem pašvaldību iestādēs (27.01.2021.) <a href="https://www.bis.gov.lv/news/notiks-vebinari-bis-lietotajiem-pasvaldibu-iestades">https://www.bis.gov.lv/news/notiks-vebinari-bis-lietotajiem-pasvaldibu-iestades</a></p> <p>2. Publikācija: Aicinām noskatīties vebināra “Kā uzsākt dzīvokļa vienkāršoto atjaunošanu ar apliecinājuma karti?” ierakstu (05.02.2021.) <a href="https://www.bis.gov.lv/news/aicinam-noskatities-vebinara-ka-uzsakt-dzivokla-vienkarsoto-atjaunosanu-ar-apliecinajuma-karti-ierakstu">https://www.bis.gov.lv/news/aicinam-noskatities-vebinara-ka-uzsakt-dzivokla-vienkarsoto-atjaunosanu-ar-apliecinajuma-karti-ierakstu</a></p> <p>3. Publikācija: Tikai katrs desmitais publiskas ēkas īpašnieks novērtējis savu īpašuma tehnisko stāvokli (15.02.2021.)</p>
----	-------------	----------------	----	--





				<p><a href="https://www.bis.gov.lv/news/tikai-katrs-desmitais-publiskas-ekas-ipasnieks-novertejis-sava-ipasuma-tehnisko-stavokli">https://www.bis.gov.lv/news/tikai-katrs-desmitais-publiskas-ekas-ipasnieks-novertejis-sava-ipasuma-tehnisko-stavokli</a></p> <p>4. Publikācija: Pirmo reizi privātmāju īpašniekiem būs pieejams atbalsts māju atjaunošanai un energoefektivitātes uzlabošanai (15.02.2021.)</p> <p><a href="https://www.bis.gov.lv/news/pirmo-reizi-privatmaju-ipasniekiem-bus-pieejams-atbalsts-maju-atjaunosanai-un-energoefektivitates-uzlabosanai">https://www.bis.gov.lv/news/pirmo-reizi-privatmaju-ipasniekiem-bus-pieejams-atbalsts-maju-atjaunosanai-un-energoefektivitates-uzlabosanai</a></p> <p>5. Publikācija: Š.g. 19.februārī notiks vebinārs “Kā uzsākt 1.grupas būves (piem., nojumes, šķūnīša) būvniecību?” (16.02.2021.)</p> <p><a href="https://www.bis.gov.lv/news/s-g-19-februari-notiks-vebinars-ka-uzsakt-1-grupas-buves-piem-nojumes-skunisa-buvniecibu">https://www.bis.gov.lv/news/s-g-19-februari-notiks-vebinars-ka-uzsakt-1-grupas-buves-piem-nojumes-skunisa-buvniecibu</a></p> <p>6. Publikācija: Aicinām būvkomersantus izteikt viedokli par BIS reģistru pakalpojumiem (22.02.2021.)</p> <p><a href="https://www.bis.gov.lv/news/aicinam-buvkomersantus-izteikt-viedokli-par-bis-registru-pakalpojumiem">https://www.bis.gov.lv/news/aicinam-buvkomersantus-izteikt-viedokli-par-bis-registru-pakalpojumiem</a></p>
--	--	--	--	---



				<p>7. Publikācija: Aizpildi anketu par BIS sākulapas saturu! (01.03.2021.) <a href="https://www.bis.gov.lv/news/aizpildi-anketu-par-bis-sakumlapas-saturu">https://www.bis.gov.lv/news/aizpildi-anketu-par-bis-sakumlapas-saturu</a></p> <p>8. Publikācija: OiRA – pieejami trīs dažādi interaktīvi rīki darba vides risku novērtēšanai būvniecībai (02.03.2021.) <a href="https://www.bis.gov.lv/news/oira-pieejami-tris-dazadi-interaktivi-riki-darba-vides-risku-novertesanai-buvniecibai">https://www.bis.gov.lv/news/oira-pieejami-tris-dazadi-interaktivi-riki-darba-vides-risku-novertesanai-buvniecibai</a></p> <p>9. Publikācija: Aicinām uz diviem vebināriem par ieteikumiem ēku atjaunošanas procesā (18.03.2021.) <a href="https://www.bis.gov.lv/news/aicinam-uz-diviem-vebinariem-par-ieteikumiem-eku-atjaunosanas-procesa">https://www.bis.gov.lv/news/aicinam-uz-diviem-vebinariem-par-ieteikumiem-eku-atjaunosanas-procesa</a></p> <p>10. Publikācija: 01.04.2021. notiks vebinārs “Kā sagatavot un iesniegt ieceres iesniegumu inženierbūvei BIS?” (25.03.2021.) <a href="https://www.bis.gov.lv/news/01-04-2021-notiks-vebinars-ka-sagatavot-un-iesniegt-ieceres-iesniegumu-inzenierbuvei-bis">https://www.bis.gov.lv/news/01-04-2021-notiks-vebinars-ka-sagatavot-un-iesniegt-ieceres-iesniegumu-inzenierbuvei-bis</a></p>
--	--	--	--	---

### 3. Projekta 3.laidiena izstrāde

Izstrādāta, saskaņota 3.laidiena “Būvju ekspluatācija 1.daļa” tehniskās specifikācija. Noritējušas darba grupas par biznesa prasību izstrādi un norit funkcionalitātes pilnveides darbi.

Plānotās pilnveides:

- ✓ Būves ekspluatācijas lietas pilnveidošana, t.sk. mājas lietas izveidošana;
- ✓ Ar ēkas tehnisko uzturēšanu saistīti dokumenti;
- ✓ Pārvaldnieku reģistra uzlabojumi, t.sk. reģistrēšanās pakalpojuma pilnveide;
- ✓ Brīdinājumu, paziņojumu izsūtīšana pārvaldniekiem un īpašniekiem;
- ✓ Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu darba plūsmu pilnveide.

Funkcionalitātes izstrāde plānota līdz 2021.gada aprīlim. Produkcija plānota ar 2021.gada jūniju.

### 4. Projekta 4.laidiena izstrāde

Izstrādāta un saskaņota 4.laidiena “Būvniecības process 2.daļa” tehniskās specifikācija un izstrāde tiks uzsākta šī gada aprīlī. Laidiens tiks sadalīts 6.sprintos un plānots veikt funkcionalitātes pilnveides sekojošās tēmās:

- ✓ ***Būvniecības atkritumu/būvgružu uzskaitē.*** Plānots izstrādāt būvgružu pārvadājumu datu BIS un APUS integrāciju, lai atvieglotu būvniecības procesa kontroles iestāžu darbu- BIS un APUS sistēmu integrācija nodrošinās efektīvāku atkritumu utilizācijas un par to atbildīgo personu uzraudzību, kā arī veicinās būvniecības atkritumu savācēju un pārstrādātāju godprātību.
- ✓ ***Trešo pušu saskaņojumi.*** Plānots izstrādāt risinājumu, kas nodos ieceres iesniedzējam sarakstu ar personām (trešo pušu identificēšana), ar ko iespējams veikt saskaņošanu BIS un ar kurām ārpus BIS (nosūtot ieceres saskaņošanas pieprasījumu uz e-adresi), tādējādi atvieglot darbu arī būvvaldēm.
- ✓ ***Datu apmaiņas servisa pilnveide ar PMLP.*** Tiks veikta BIS datu apmaiņas saskarnes pilnveide ar PMLP, nodrošinot vienota Latvijas iedzīvotāju un ārvalstnieku reģistra izmantošanu.
- ✓ ***Meliorācijas objektu būvniecības procesa elektronizēšana.*** Tiks veikta integrācijas izveide ar ZMNĪ uzturēto Meliorācijas kadastra IS datu nodošanai un saņemšanai BIS, lai elektronizētu meliorācijas objektu būvniecības procesu.
- ✓ ***Integrācijas risinājums ar TA Izpildu lietu reģistru (ILR).*** Tiks veikta BIS un ILR integrācija, nodrošinot pilnu būvniecības lietas un ekspluatācijas lietas datu apjoma nodošanu zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

- ✓ **Būvniecības procesa uzraudzības un būvspeciālistu datu pārvaldības pilnveide.** Plānots realizēt VEDLUDB datu sasaisti ar būvspeciālistu datiem, lai uzraugošajām institūcijām nodrošinātu būvspeciālistu pārraudzību.
- ✓ **Būvniecībā iesaistīto lomu darba vietu un procesu darba plūsmu pilnveide.** T.sk. būvdarbu žurnāla funkcionalitātes uzlabojumi; apziņošanas un informēšanas uzlabojumi; inteliģenta aģenta rīks sistēmas procesu un lēmumu pieņemšanas automatizēšanai.
- ✓ **Unificētās saskarnes pilnveide.** Unificētās saskarnes pielāgošana universālajai pašvaldības darba vietai nodrošinās autentifikāciju BIS, izmantojot pašvaldības informācijas sistēmas lietotāja autentifikācijas parametrus, pie nosacījuma, ka lietotājs autentificējies ar vienoto pieteikšanās moduli Latvija.lv.
- ✓ **BIS saskarņu nodrošinājumu pilnveide ar VISS savietotāju.** BIS datu nodošanu uz ILR, tiks realizēta caur VISS.
- ✓ **Integrācija ar VVAIS.** BIS nomenklatūras atjaunošana atbilstoši funkcionalitātes izmaiņām.
- ✓ **Integrācija BIS-TAPIS papildinājuma izstrāde.**



Sīkāka informācija par plānotajām darba grupām, sprintu tēmām un informācija dalībai tajās:

<https://bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-gaita>.



## 5. Projekta 5.laidiena izstrāde

Uzsākts darbs pie tehniskās specifikācijas izstrādes 5.laidienam “Ekspluatācija – 2.daļa”.

Tehniskā specifikācija tiks izstrādāta līdz 2021.gada augustam.

## 6. Papildus funkcionalitāte, kas ieviesta pārskata periodā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 21.08.2018. noteikumu Nr.531 “Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību Ēku energoefektivitātes jomā” (turpmāk – noteikumi Nr.531) grozījumiem, kas stājās spēkā 01.04.2021. BIS reģistru sadaļā (BIS1) ir izstrādāts rēķinu izrakstīšana modulis neatkarīgajiem ekspertiem par patstāvīgās prakses uzraudzību un LVS tiešsaistes lasītavas abonēšanu, vienlaikus nodrošinot sertificēšanas iestādei atzīmēt BIS informāciju par neatkarīgo ekspertu veiktajiem maksājumiem.

Atbilstoši noteikumiem Nr.531 ir precizēti neatkarīgo ekspertu profesionālās darbības pārkāpumu konstatētajos gadījumos piemērojamie pārkāpumu uzskaites pamatojumi un punkti.

Vienlaikus ir izstrādāta iespēja reģistrēt kā neatkarīgus ekspertus personas, kas ir ārvalstu pilsoņi vai izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, kā arī līdzīgi kā Latvijas pilsoņiem autorizēties BIS un reģistrēt ēku energosertifikātus.

## 7. Apmācības

2021.gada I.semestrī BVKB organizējis 34 apmācību tiešsaistes pasākumus, kuros piedalījušies 3114 dalībnieki (ERAF 2.kārtas ietvaros par 2.laidiena “Būvniecības process – 1.daļa” funkcionalitāti 21 pasākumi un 936 dalībnieki; uzturēšanas ietvaros dažādu tēmu 13 pasākumi un 2178 dalībnieki).

Aicinām sekot līdz informācijai un apmācību tēmām:

<https://bis.gov.lv/bisp/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-informativie-pasakumi-un-macibas>

Apmācību kalendārs: <https://www.bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas/apmacibu-kalendars>


Apmācības tiek nodrošinātas tiešsaistē un pieejamas bez maksas.

Papildus aicinām sekot līdz sadaļai Biežāk uzdotie jautājumi: <https://www.bis.gov.lv/biezak-uzdotie-jautajumi>

## 8. Projekta aktivitāšu ieviešanas tuvākie plāni un grafiks

Nākamajā periodā (2021.gada II.ceturksnis) plānots pabeigt darbu pie 5.laidiena “Ekspluatācija 2.daļa” tehniskās specifikācijas izstrādes. Turpināt funkcionalitātes pilnveides 4.laidiena “Būvniecības process – 2.daļa” ietvaros.

## Aktivitāšu ieviešanas grafiks

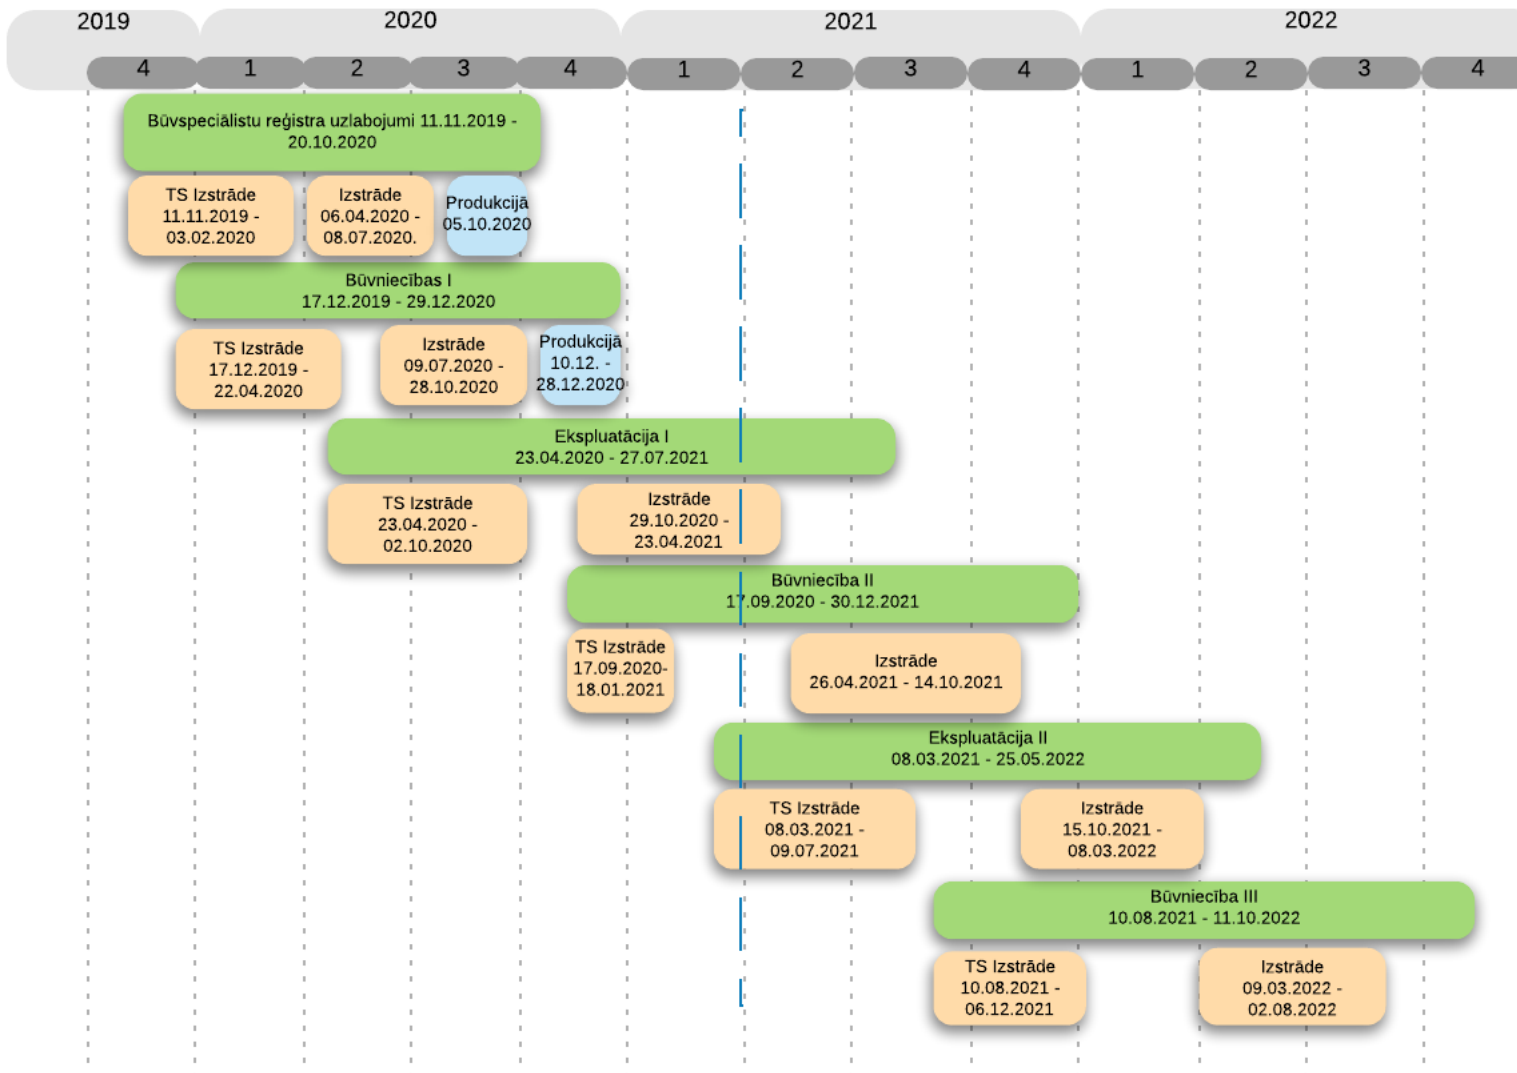

## 9. Progresā informācija un materiāli:

Informācija par projekta progresu Būvniecības informācijas sistēmas portālā -  
<https://www.bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta>

Līdz šim izstrādātie apmācību materiāli pieejami:

- <https://www.bis.gov.lv/bis-projekti/eraf-projekts-2karta/projekta-informativie-pasakumi-un-macibas>
- <https://www.bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas>
- <https://www.youtube.com/watch?v=h2LGao477Ww&list=PLrzcjRWPputhiwshn7okF8iEvcyuePYM>

Sekoiet līdz arī Būvniecības valsts kontroles biroja jaunumiem sociālo tīklu profilos:  
Facebook lapās:

<https://www.facebook.com/bvkbly>

<https://www.facebook.com/bislv>

Youtube kontā:

[https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaljBLz2QWCreumvHA?view\\_as=subscriber](https://www.youtube.com/channel/UCqmoJqaljBLz2QWCreumvHA?view_as=subscriber)

Twitter kontā: <https://twitter.com/BBirojs>

## 10. Kontaktinformācija:

Būvniecības valsts kontroles birojs

Informāciju sistēmu departaments

Būvniecības informācijas sistēmas attīstības nodaļas

Projekta vadītāja Aija Vule

[Aija.Vule@bvkb.gov.lv](mailto:Aija.Vule@bvkb.gov.lv)

Tel.: +371 20259623
